


今後の整備スケジュール


※資材調達等の影響により、変更となる場合があります。

		2025			2026				2027	
		4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3	4~6
東側	当初	工事 ★東側完成（6月末）								
	変更	工事 ★東側完成（7月末）								
西側		工事契約・準備期間 工事①（親水空間・シーバス周辺）			工事契約・準備期間	工事②（西側エントランス）★西側完成				

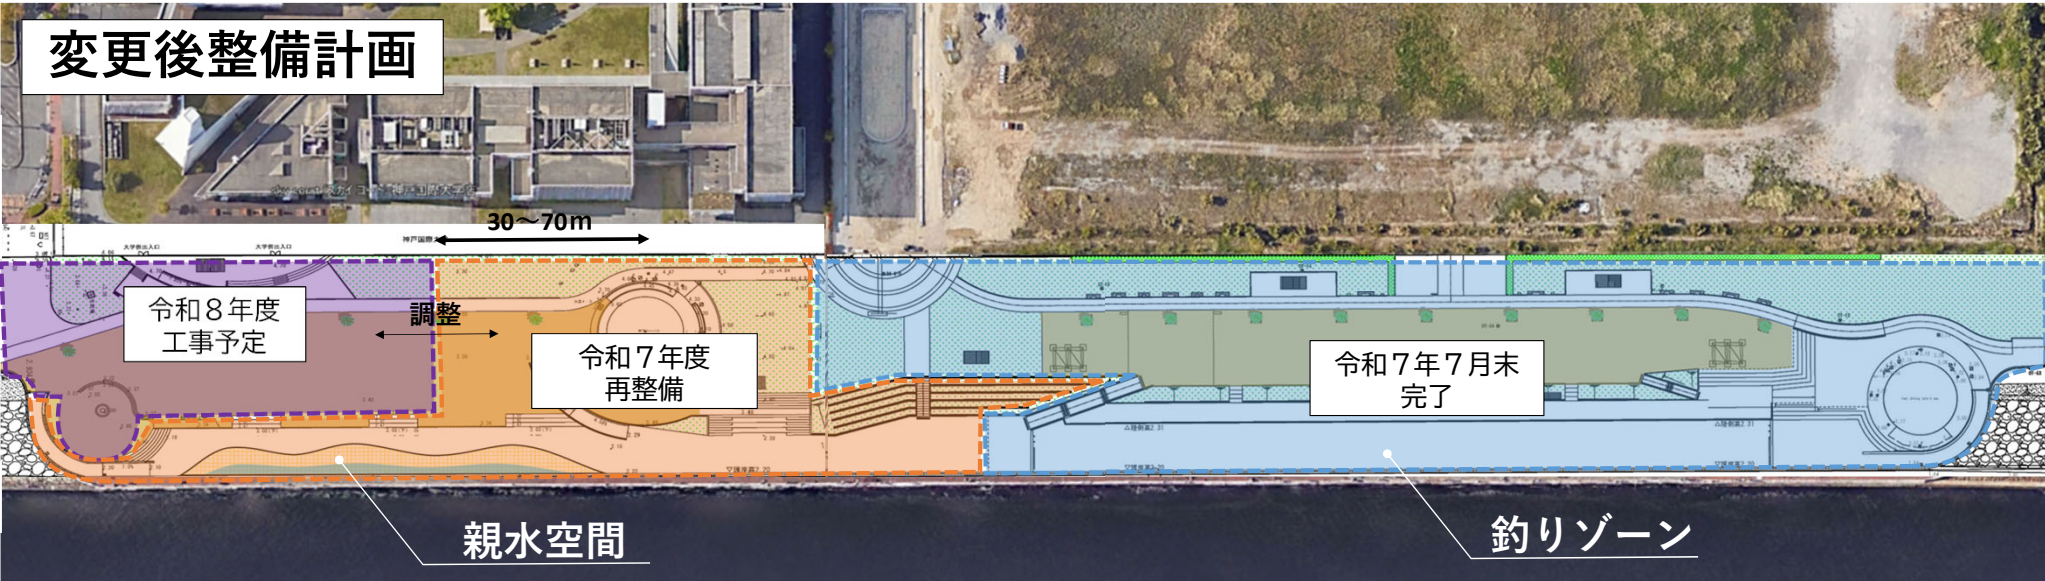

工事ステップ①

R7.6月末

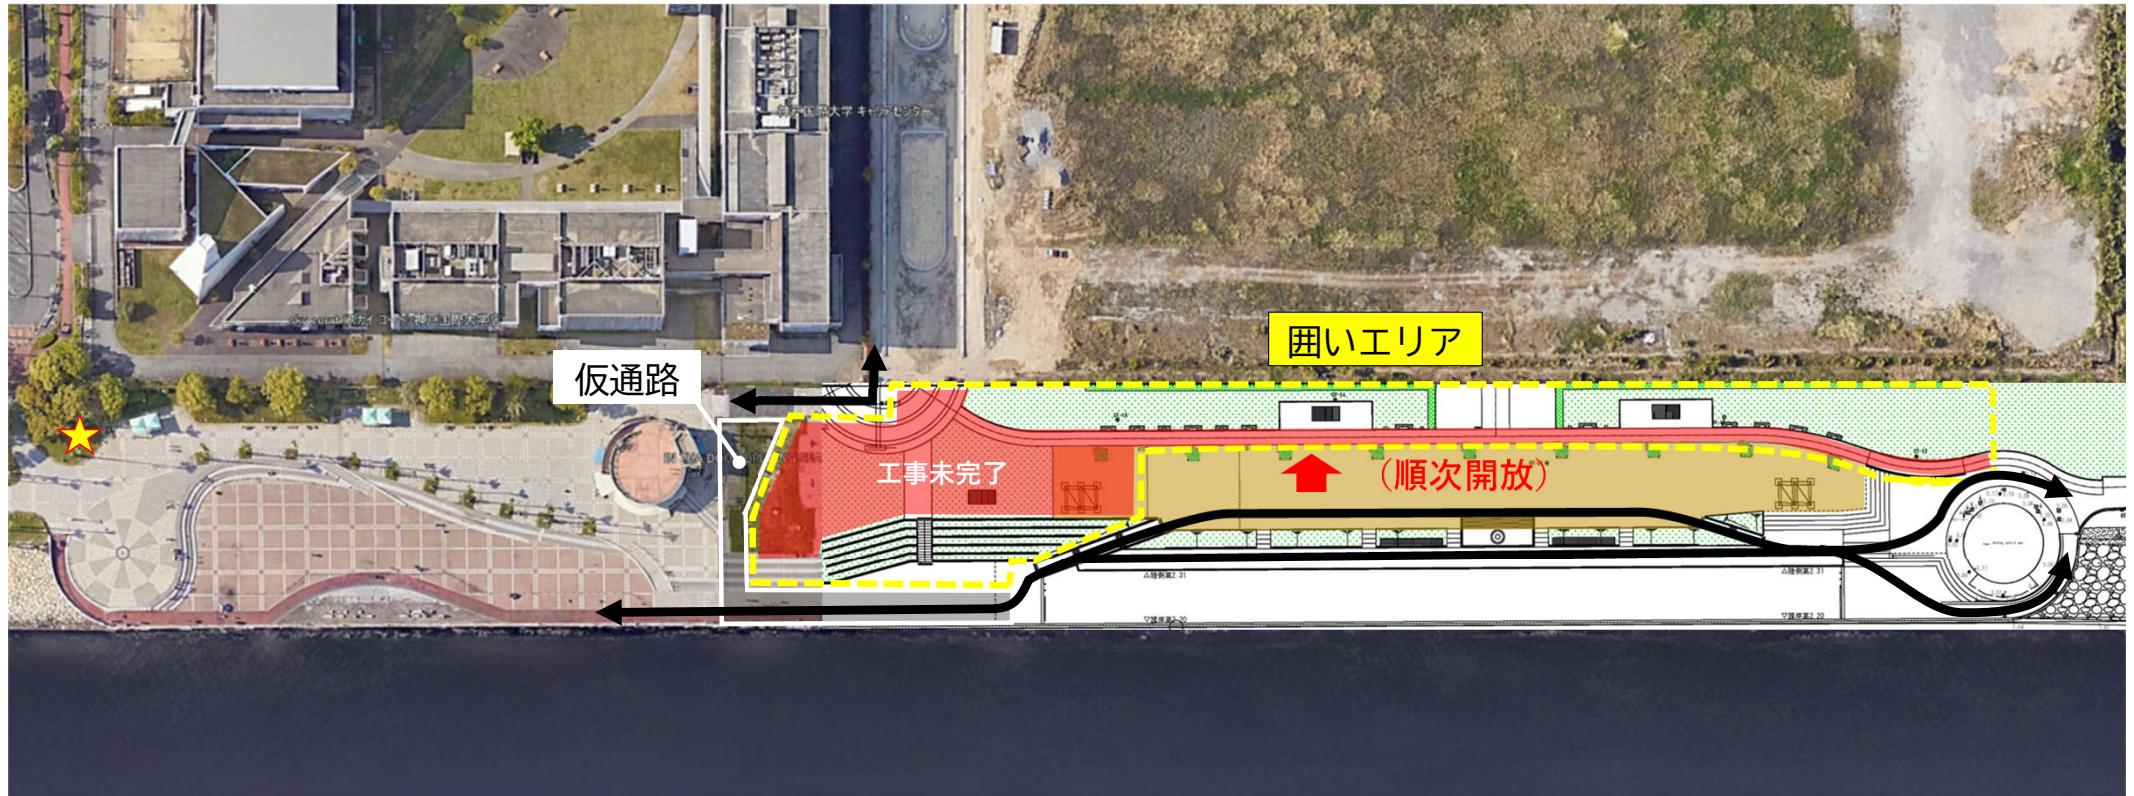

工事ステップ②

R7.7月末

